- VILLE DE MAROMME- REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME
PLANNING EXE RECALLE LOT 11 FINITION 12/08/2011

N°	lots concernés	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Tous	Ordre de service	1 jour	Mar 11/01/11	Mar 11/01/11
2	Tous	Préparation de chantier	20 jours	Mer 12/01/11	Mar 08/02/11
3	Lot 01	Installation de chantier/cantonnement zone	2 jours	Mer 09/02/11	Jeu 10/02/11
4	Lot 01	plan de retrait amiante	20 jours	Mer 12/01/11	Mar 08/02/11
5	Lot 01	dépose sols amiantés	1 jour	Ven 11/02/11	Ven 11/02/11
6	TOUS	remise des plans réservations	10 jours	Mer 12/01/11	Mar 25/01/11
7	TOUS	plans EXE / VISA	20 jours	Mer 26/01/11	Mar 22/02/11
8	MOE	VISA sur plans EXE / VISA	5 jours	Mer 23/02/11	Lun 21/03/11
9	Lots 9/10	Neutralisation des réseaux	2 jours	Mer 26/01/11	Jeu 27/01/11
10	Lots 9/10	Dépose réseaux appareils	10 jours	Ven 28/01/11	Jeu 10/02/11
11	Lot 01	Investigations du sous-sol/fondations	2 jours	Lun 28/02/11	Lun 21/03/11
12	Lot 01	Alléges maçonnées	10 jours	Ven 11/02/11	Jeu 24/02/11
13	Lot 01	démolition ouvrages béton, Ouvertures et linteaux	20 jours	Lun 14/02/11	Jeu 31/03/11
14	Lot 01	démolition cheminée	5 jours	Ven 11/02/11	Jeu 17/02/11
15	Lot 05	dépose des fenêtres	5 jours	Lun 07/02/11	Ven 11/02/11
16	Lot 01	Fondations ascenseur	10 jours	Mar 22/03/11	Lun 04/04/11
17	Lot 01	Fondations serre	5 jours	Mar 05/04/11	Lun 11/04/11
18	Lot 01	cage ascenseur	10 jours	Mar 05/04/11	Lun 18/04/11
19	Lot 01	escaliers rampes seuil	15 jours	Ven 01/04/11	Jeu 21/04/11
20	Lot 02	Fabrication: Charpente galvanisation	10 jours	Mar 22/03/11	Lun 04/04/11
21	Lot 02	Charpente Metallique	15 jours	Mar 12/04/11	Lun 02/05/11
22	Lot 04	isolation PSE sous polycarbonate	20 jours	Mar 19/04/11	Lun 16/05/11
23	Lot 04	isolation PSE NORD	5 jours	Mar 19/04/11	Lun 25/04/11
24	Lot 04	isolation PSE OUEST	5 jours	Mar 26/04/11	Lun 02/05/11
25	Lot 04	isolation PSE SUD	5 jours	Mar 03/05/11	Lun 09/05/11
26	Lot 04	isolation PSE EST	5 jours	Mar 10/05/11	Lun 16/05/11
27	Lot 04	isolation PSE en RDC	25 jours	Mar 17/05/11	Lun 20/06/11
28	Lot 05	approv des fenêtres	32 jours	Lun 14/02/11	Lun 18/04/11
29	Lot 05	pose des fenêtres ALU	6 jours	Lun 25/04/11	Lun 02/05/11
30	Lot 05	pose des fenêtres ALU ascenseur	6 jours	Mar 03/05/11	Mar 10/05/11
31	Lot 05	Habillage tableaux ALU	6 jours	Mar 03/05/11	Mar 10/05/11
32	Lot 05	pose des fenêtres PVC	6 jours	Mer 27/04/11	Mer 04/05/11
33	Lot 08	pose de l'ascenseur	15 jours	Lun 23/05/11	Ven 10/06/11
34	Lot 08	Essai ascenseur	2 jours	Jeu 08/09/11	Ven 09/09/11
35	Lot 08	Mise en route ascenseu	2 jours	Lun 12/09/11	Mar 13/09/11
36	Lot 03	approvisionnement Bar	30 jours	Mar 22/03/11	Lun 02/05/11
37	Lot 03	ossature secondaire bardage	15 jours	Mar 03/05/11	Lun 23/05/11

ULYSSES SARL D'ARCHITECTURE
15 RUE DU MOULIN A POUDRE 76 150 MAROMME
TEL 02 35 33 30 76 FAX 02 35 33 47 85

Ven 12/08/11

- VILLE DE MAROMME- REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME
PLANNING EXE RECALLE LOT 11 FINITION 12/08/2011

N°	lots concernés	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
38	Lot 03	bardage polycarbonate	20 jours	Mar 24/05/11	Lun 20/06/11
39	Lot 03	bardage polycarbonate NORD	5 jours	Mar 24/05/11	Lun 30/05/11
40	Lot 03	bardage polycarbonate OUEST	5 jours	Mar 31/05/11	Lun 06/06/11
41	Lot 03	bardage polycarbonate SUD	5 jours	Mar 07/06/11	Lun 13/06/11
42	Lot 03	bardage polycarbonate EST	5 jours	Mar 14/06/11	Lun 20/06/11
43	Lot 03	Couverture polycarbona	5 jours	Mar 21/06/11	Lun 27/06/11
44	Lot 04	étanchéité terrasse ascenseur	5 jours	Mar 19/04/11	Lun 25/04/11
45	Lot 03	tôles perforées	5 jours	Lun 05/09/11	Ven 09/09/11
46	MOU	raccordement chaufferie	15 jours	Lun 23/05/11	Ven 10/06/11
47	Lot 01	Cloisonnement intérieure	10 jours	Mar 19/04/11	Lun 02/05/11
48	Lot 01	enduit	10 jours	Mar 03/05/11	Lun 16/05/11
49	Lot 06	Cloisonnement Placo/Menuis bois	25 jours	Jeu 05/05/11	Mer 08/06/11
50	Lot 09	Distribution électrique	40 jours	Jeu 05/05/11	Mer 14/09/11
51	Lot 10	Distribution ventilation	15 jours	Mar 03/05/11	Lun 23/05/11
52	Lot 10	distribution PB	12 jours	Jeu 05/05/11	Ven 20/05/11
53	Lot 10	distribution CHAUFF	12 jours	Lun 23/05/11	Mar 07/06/11
54	Lot 10	Interventions chaufferie	10 jours	Mer 08/06/11	Mar 21/06/11
55	Lot 10	appareillage sanitaire	12 jours	Lun 07/11/11	Mar 22/11/11
56	Lot 07	préparation peinture	10 jours	Mar 30/08/11	Lun 12/09/11
57	Lot 09	pose TGBT ET TD	5 jours	Jeu 15/09/11	Mer 21/09/11
58	Lot 09	appareillage électrique	10 jours	Mar 24/05/11	Lun 06/06/11
59	lot 06	faux plafond	15 jours	Mar 13/09/11	Ven 28/10/11
60	lot 09	appareillage éclairage	15 jours	Mar 13/09/11	Mer 16/11/11
61	lot 10	appareillage ventilation	5 jours	Mar 13/09/11	Lun 19/09/11
62	lot07	Peinture finitions	14 jours	Mar 13/09/11	Ven 30/09/11
63	**Tous**	**RECEPTION PARTIELLE LOTS 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10**	**5 jours**	**Lun 03/10/11**	**Ven 07/10/11**
64	Lot11	Consultation lot finitions	25 jours	Mar 30/08/11	Lun 03/10/11
65	Lot11	désignation Lot11 Finit	10 jours	Mar 04/10/11	Lun 17/10/11
66	Lot11	préparation peinture	10 jours	Mar 18/10/11	Lun 31/10/11
67	lot11	Ragréage des sols	10 jours	Jeu 20/10/11	Mer 02/11/11
68	Lot 11	Faïence	4 jours	Mar 01/11/11	Ven 04/11/11
69	lot11	Peinture de sols	10 jours	Lun 07/11/11	Ven 18/11/11
70	lot11	Peinture finitions	20 jours	Mar 01/11/11	Lun 28/11/11
71	Tous	tous essais	2 jours	Mar 29/11/11	Mer 30/11/11
72	Tous	nettoyage	2 jours	Jeu 01/12/11	Ven 02/12/11
73	**Tous**	**OPR/Réception**	**5 jours**	**Lun 05/12/11**	**Ven 09/12/11**
74	**Tous**	**Levée des réserves**	**10 jours**	**Lun 12/12/11**	**Ven 23/12/11**
75	**Tous**	**délai global**	**204 jours**	**Mar 11/01/11**	**Ven 09/12/11**

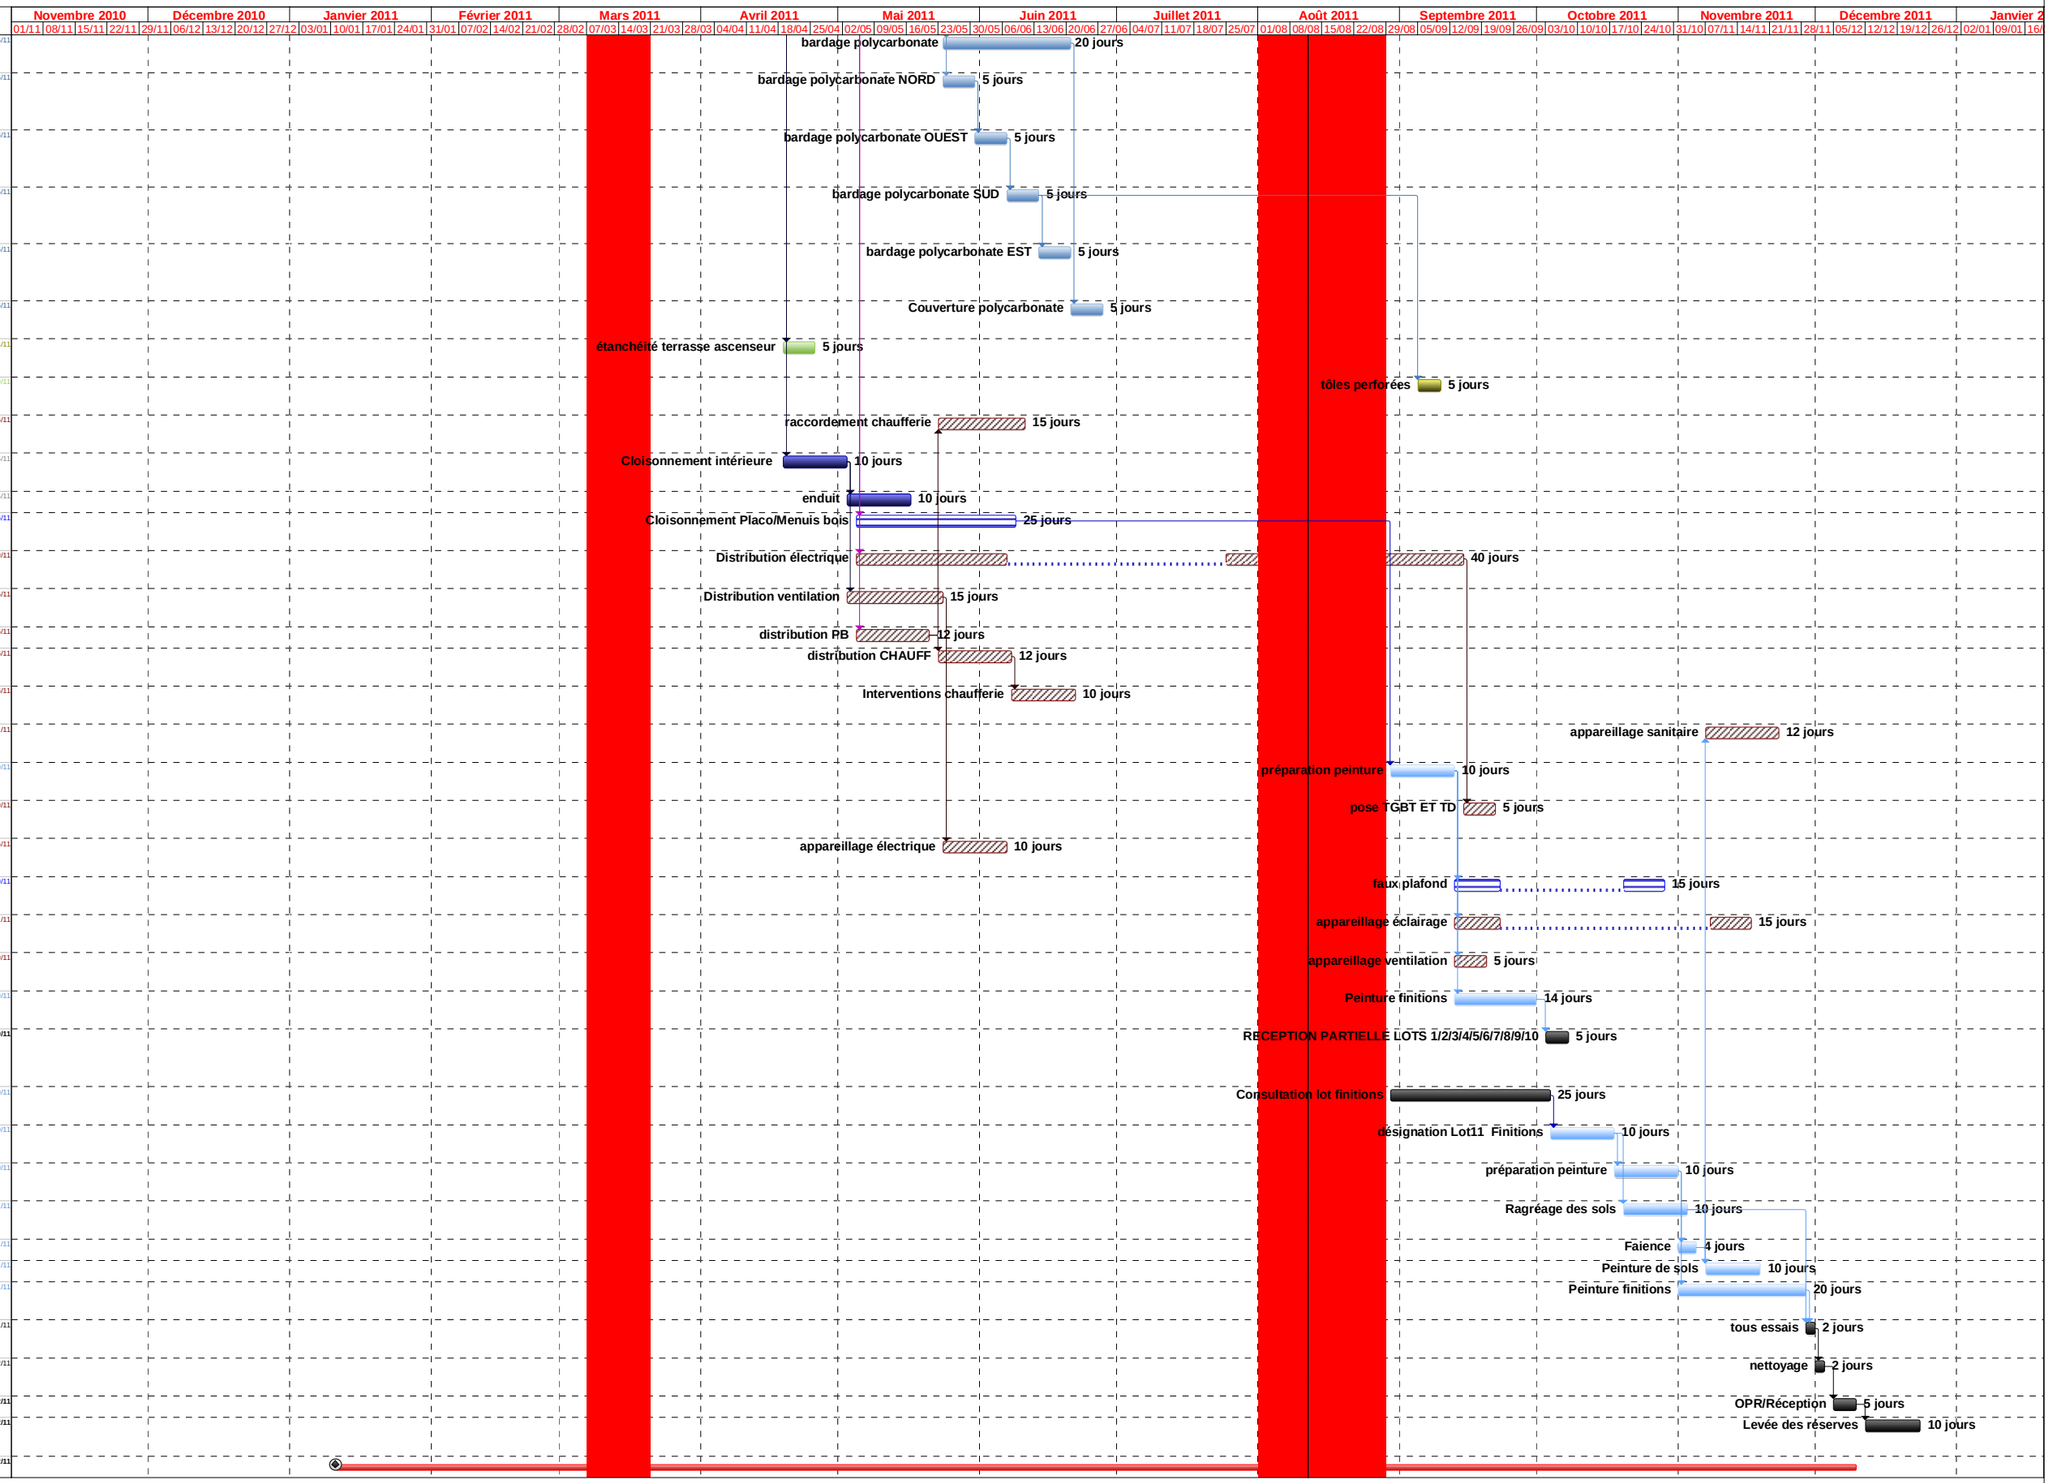

ULYSSES SARL D'ARCHITECTURE
15 RUE DU MOULIN A POUDRE 76 150 MAROMME
TEL 02 35 33 30 76 FAX 02 35 33 47 85

Ven 12/08/11
